

**QUILLOTA, 14 de septiembre de 2022.**  
**La Alcaldía decretó hoy lo que sigue:**

**D.A. NUM: 8936 /VISTOS:**

1. Ord. N°227/2022, de 23 de agosto de 2022, de Inspector Técnico de Obra del Proyecto **“Diseño de Ingeniería y Especialidades, Parque El Edén, Comuna de Quillota”** a Alcalde, con V° B° Alcaldicio, en que solicita autorizar emisión Decreto Alcaldicio que regularice y apruebe ampliación de plazo por **90 días corridos**, a partir del **21 de julio del 2022 y hasta el 19 de octubre del 2022, ambas fechas inclusive**, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio N°8765 del 02 de diciembre del 2020, al proponente identificado como **Ingeniería Felipe Vienne Arancibia E.I.R.L., RUT 76.370.051-8, representado legalmente por Felipe Vienne Arancibia, Cédula de Identidad N°16.950.744-9**. Es de suma importancia indicar que la solicitud de la ampliación de plazo se fundamenta en lo siguiente:
  - Según conversaciones con el revisor del Seremi de Salud, Daniel Jaraquemada, se informa a Felipe Vienne y Juan Báez de la Secplan de la Municipalidad que existe un reclamo en curso por parte del antiguo Administrador del Edén. Debido a ese reclamo no se pueden revisar las piscinas hasta que esté solucionado ese tema.
2. Ord. N°192 de 20.07.2022, que solicitó autorización Decreto Alcaldicio para regularización de ampliación de plazo del proyecto “Diseño de Ingeniería y Especialidades, Parque El Edén, Comuna de Quillota” y que no fue autorizada dicha prórroga;
3. Carta de solicitud de Ampliación de plazos N°07/2022, del 18.07.2022 de “Ingeniería Felipe Vienne Arancibia EIRL”;
4. D.A N°6512 del 31.05.2022, que regularizó ampliación de plazo del proyecto **“DISEÑO DE INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES, PARQUE EL EDÉN, COMUNA DE QUILLOTA”**, que fue adjudicado por Decreto Alcaldicio N°8765 de 02 de diciembre del 2020 al contratista Ingeniería Felipe Vienne Arancibia E.I.R.L., RUT N°76.370.051-8, por 60 días corridos, a partir del 22 de mayo de 2022 y hasta el 20 de julio de 2022, ambas fechas inclusive;
5. Decreto Alcaldicio N°8765 de 02.12.2020, que adjudicó la Licitación Pública ID 2831-43-LE20 para contratar la ejecución del proyecto denominado: **“DISEÑO DE INGENIERIA Y ESPECIALIDADES, PARQUE EL EDÉN, COMUNA DE QUILLOTA”**, al proponente identificado como: **INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANCIBIA E.I.R.L.**, RUT N°76.370.051-8, representada legalmente por Don Felipe Vienne Arancibia, Cédula de Identidad N°16.950.744-9, con domicilio en 13 Norte N°853 Of. 803, Viña del Mar, en la **suma total de \$25.000.000.- Exento de IVA.** y en un plazo de ejecución y entrega de los diseños de ingeniería y especialidades de **110 días corridos**, el que comenzará a partir de la firma del Acta de Inicio del Servicio;
6. La facultades que me confiere la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Administración Municipal
  2. Alcaldía
  3. Control Interno
  4. DOM
  5. Finanzas
  6. Jurídico
  7. Presupuesto
  8. ITS (Juan Báez)
  9. SECPLAN
  10. Secretaría Municipal.
- OCS/XVA/camv/maom.-**


**DECRETO**


**PRIMERO:** **REGULARIZASE** ampliación de plazo del proyecto “**DISEÑO DE INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES, PARQUE EL EDÉN, COMUNA DE QUILLOTA**”, que fue adjudicado por Decreto Alcaldicio N°8765 de 02 de diciembre del 2020, al contratista Ingeniería Felipe Vienne Arancibia E.I.R.L., RUT N°76.370.051-8, por 90 días corridos, desde el 21 de julio del 2022 y hasta el 19 de octubre del 2022, ambas fechas inclusive.

**SEGUNDO:** **ESTABLÉCESE** que la empresa “**INGENIERÍA FELIPE VIENNE ARANCIBIA E.I.R.L.**”, RUT N°76.370.051-8, deberá actualizar la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Póliza de Seguro.

**TERCERO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el Anexo Modificadorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**CUARTO:** **ADOPTEN** la Secretaría Comunal de Planificación las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

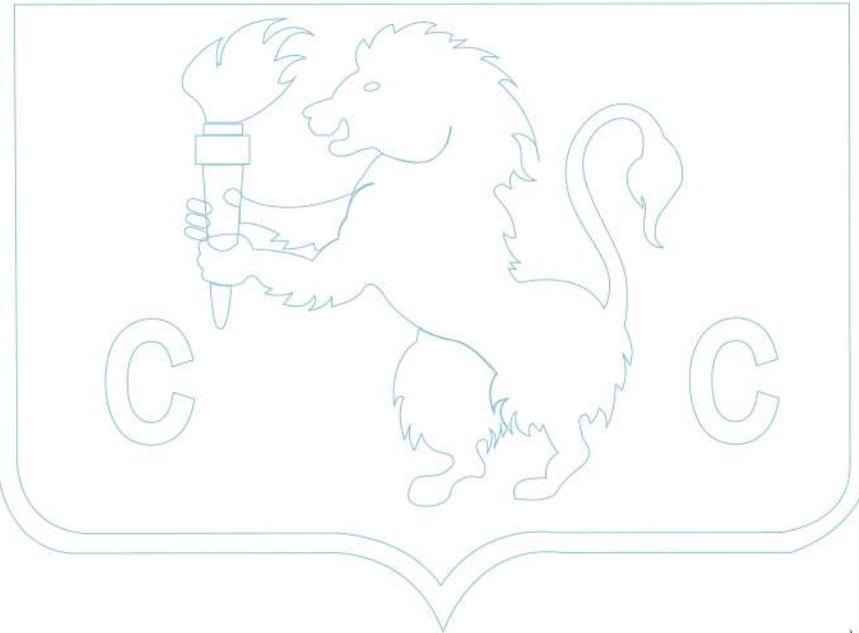

  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
Firmado Electrónicamente por:  
**XIMENA VALDIVIESO ARZA**  
GEOGRAFA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRA DE FE

  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
ALCALDE  
Firmado Digitalmente por  
**OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Administración Municipal
  2. Alcaldía
  3. Control Interno
  4. DOM
  5. Finanzas
  6. Jurídico
  7. Presupuesto
  8. ITS (Juan Báez)
  9. SECPLAN
  10. Secretaría Municipal.
- OCS/XVA/camv/maom.-**
